Утверждаю: _____ Белоног Ю.А.

Главный врач КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Капитальный ремонт фасадов 2-х этажного корпуса "А" КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" по адресу: г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 233.

№ п/п	Наименование работ	Кол. чел. бр.	Кол-во рабоч. дней	2020 год																											
				Май																											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2																														
1	Подготовительные работы а)Установка контейнера б)Доставка лесов	6	14																												
2	Установка лесов	16	20																												
3	Демонтажные работы а)демонтаж кондиционеров	16	3																												
4	Устройство несущего каркаса из Г образного профиля а)Крепление кронштейна б)Крепление Г образного профиля	16	40																												
5	Устройство теплоизоляционного слоя а)Устройство пароизоляционного слоя	16	25																												
6	Облицовка фасадными панелями а)Заделка декоративной полосой б)крепление кассет	16	30																												

7	Устройство оконных откосов	8	11																																
8	Установка дверей	4	7																																
9	Устройство крыльца а)Установка ограждения б)Устройство стяжки в)Укладка плитки	6	21																																
10	Устройство отмостки а)Устройство щебеночного основания б)Устройство бетонного основания	8	17																																
	Всего объем работ (чел):			Кол-во чел в бригаде (чел): – 26 Кол-во календарных дней: - 90 дней																																

Директор ТОО «Заңғар – LTD»Макенов С.С.

Директор АХБ Мартыненко Н.М.

Составил: _____ Дюсен Б.М.

2020 год

Июнь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2020 год																											
Июль																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

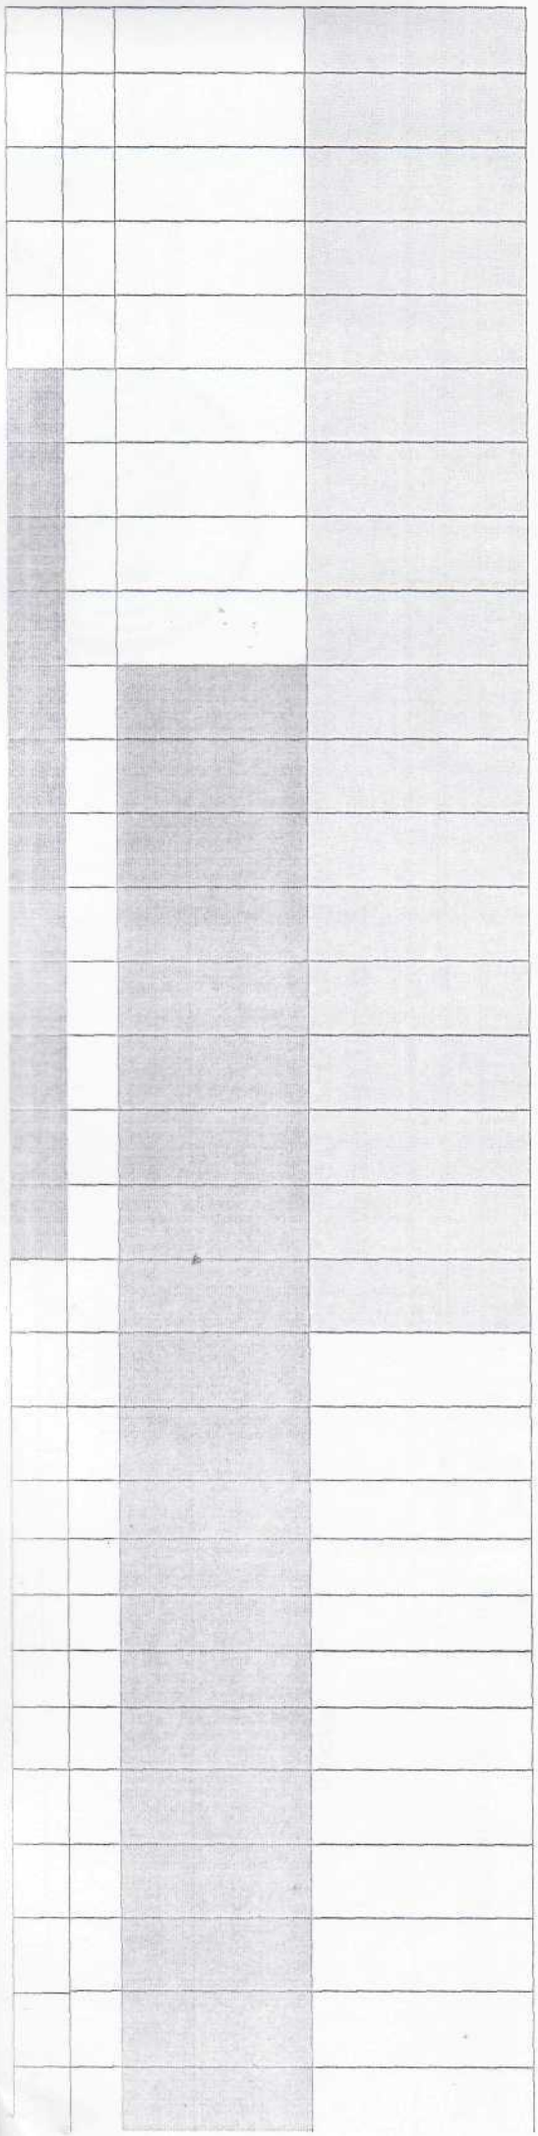

Утверждаю: _____ Белоног Ю.А.

Главный врач КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Капитальный ремонт фасада 4-этажного корпуса "Б" здания "Областного перинатального центра" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: ул. Казахстанской правды, 233 в г. Петропавловске СКО.

№ п/п	Наименование работ	Кол. чел. бр.	Кол-во рабоч. дней	2020 год																												
				Май																												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2																															
1	Подготовительные работы а)Установка контейнера б)Доставка лесов	8	22																													
2	Установка лесов	10	16																													
3	Демонтажные работы а)демонтаж кондиционеров	10	15																													
4	Устройство несущего каркаса из Г образного профиля а)Крепление кронштейна б)Крепление Г образного профиля	20	50																													
5	Устройство теплоизоляционного слоя а)Устройство пароизоляционного слоя	20	20																													
6	Облицовка фасадными панелями а)Заделка декоративной полосой б)крепление кассет	20	35																													

7	Устройство оконных откосов	8	11																														
8	Установка дверей	2	3																														
9	Устройство крыльца а)Установка ограждения б)Устройство стяжки в)Укладка плитки	8	23																														
10	Установка и подключение подъемника	3	5																														
11	Устройство отмостки а)Устройство щебеночного основания б)Устройство бетонного основания	4	16																														
12	Устройство водостока	4	6																														
	Всего объем работ (чел):			Кол-во чел в бригаде (чел): – 37 Кол-во календарных дней: - 120 дней																														

Директор ТОО «Заңғар – LTD»Макенов С.С.

Директор АХБ Мартыненко Н.М.

Составил: _____ Дюсен Б.М.

2020 год

Июнь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2020 год

Июль

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

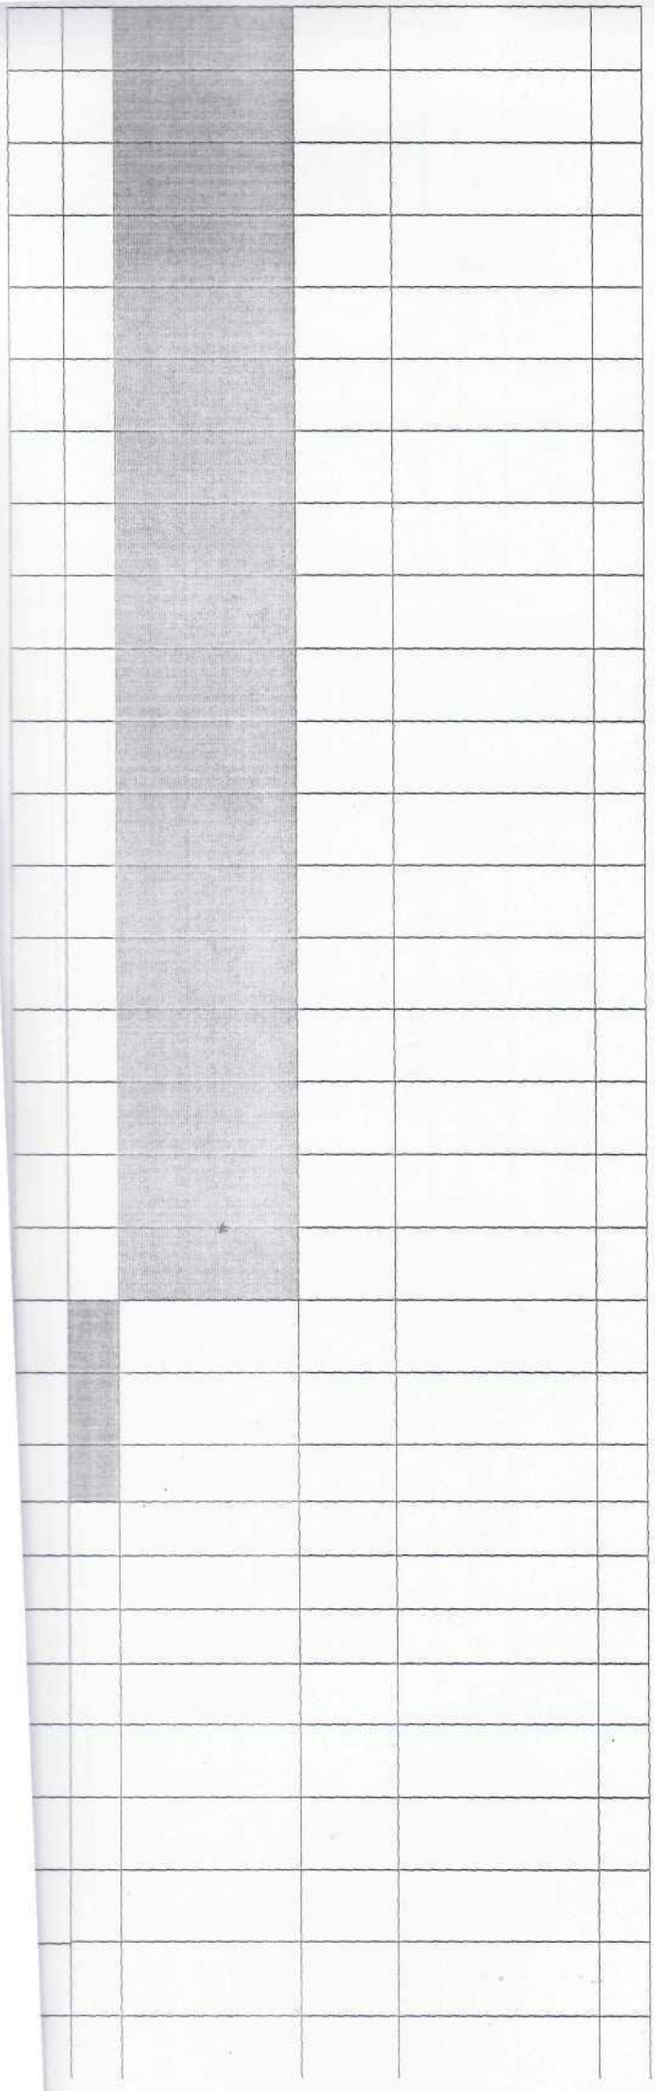

2020 год

Август
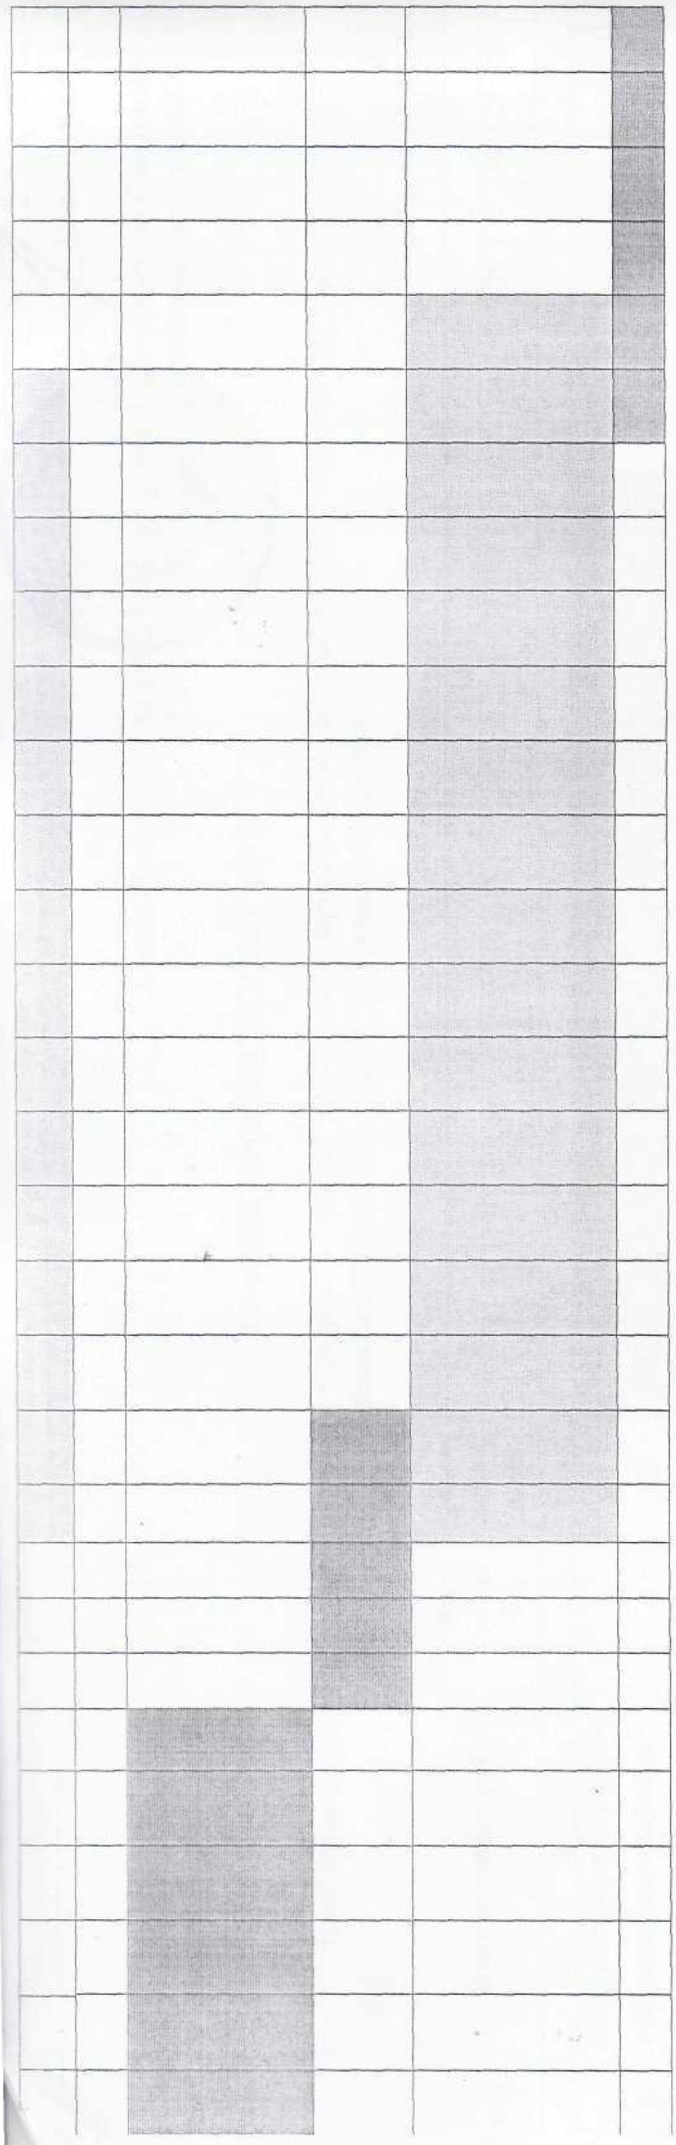
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
